

東京G豊洲鞘管内充填




施工状況

区画整理により新設されたガス管の鞘管内にJPストーンを充填しました。充填対象となる管路は3本あり、1000の鞘管内に750のガス管が挿入されているもので、すべて吸引式により施工を行いました。



充填対象管路

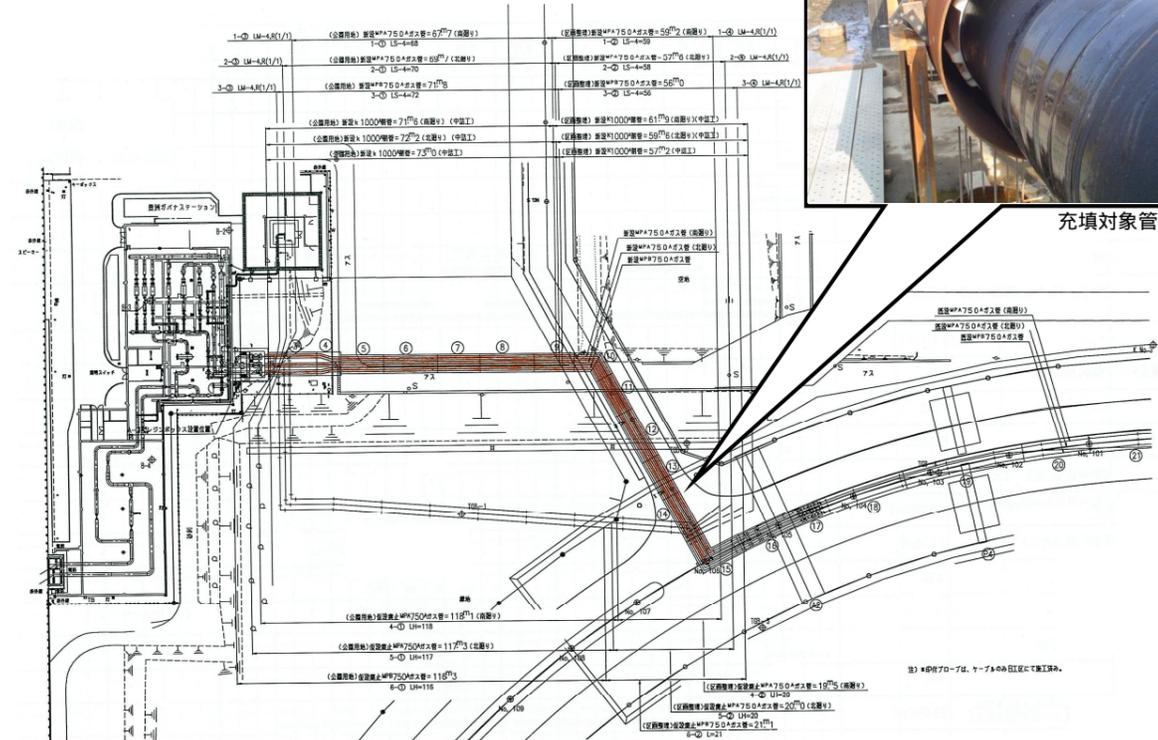

工事概要

- 工事名 : 東京G豊洲鞘管内充填
- 発注者 : 東京ガス株式会社
- 工事場所 : 東京都江東区豊洲
- 工期 : 平成17年11月30日 ~ 平成17年12月2日
- 工事内容 : 粉体充填工(吸引式) 総延長390m
JPストーン...134.1m³
付帯工...1式



充填状況



充填完了

お問い合わせはJPG工法協会までお願い致します
TEL:03-6763-0551 FAX:03-6763-3154
